Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0		**Rendiciones**	**75 días?**	**lun 04-11-24**	**vie 14-02-25**
1		**Fase 1: Configuración inicial**	**2 días**	**lun 04-11-24**	**mar 05-11-24**
2		Configuración del entorno	0,5 días	lun 04-11-24	lun 04-11-24
3		Definición de modelos y relaciones (Fondos, Gastos)	1 día	lun 04-11-24	mar 05-11-24
4		Creación de migraciones e instalación en MySQL	0,5 días	mar 05-11-24	mar 05-11-24
5		**Fase 2: Desarrollo del Backend**	**3 días?**	**mié 06-11-24**	**vie 08-11-24**
6		Implementar API para Fondos, Gastos	0,5 días	mié 06-11-24	mié 06-11-24
7		Generar views y rutas en la API	1 día	mié 06-11-24	jue 07-11-24
8		Integración con servicios	1 día	jue 07-11-24	vie 08-11-24
9		Implementar restricciones	0,5 días	vie 08-11-24	vie 08-11-24
10		**Fase 3: Desarrollo página Fondos**	**3 días?**	**lun 11-11-24**	**mié 13-11-24**
11		Diseño del formulario para asignar fondo	1 día	lun 11-11-24	lun 11-11-24
12		Implementar autocompletado y filtros	0,5 días	mar 12-11-24	mar 12-11-24
13		Validación de datos	0,5 días?	mar 12-11-24	mar 12-11-24
14		Enviar formulario de fondo mediante servicios	1 día	mié 13-11-24	mié 13-11-24
15		**Fase 4: Desarrollo de la Page del Rendidor**	**3 días?**	**jue 14-11-24**	**lun 18-11-24**
16		Mostrar datos de los fondos asignados	1 día	jue 14-11-24	jue 14-11-24
17		Implementar los servicios para la consulta de datos	0,5 días	vie 15-11-24	vie 15-11-24
18		Generar view para rendir gastos de un fondo	0,5 días	vie 15-11-24	vie 15-11-24
19		Restricciones para fondos no rendidos en el plazo establecido.	1 día?	vie 15-11-24	lun 18-11-24
20		**Fase 5: Desarrollo Page y Modal Rendir Gastos**	**3 días**	**mar 19-11-24**	**jue 21-11-24**
21		Mostrar datos del fondo	0,5 días	mar 19-11-24	mar 19-11-24
22		Generar e implementar servicios	0,5 días	mar 19-11-24	mar 19-11-24
23		Diseñar y mostrar el formulario de gastos en un modal	1 día	mar 19-11-24	mié 20-11-24
24		Implementar CRUD de gastos en tabla: Agregar, editar y eliminar.	1 día	mié 20-11-24	jue 21-11-24
25		Validar y enviar los datos de los gastos	0,5 días	jue 21-11-24	jue 21-11-24
26		**Fase 6: Desarrollo Page Visualizar y Descargar Comprobante**	**3 días?**	**vie 22-11-24**	**mar 26-11-24**
27		Generar rutas y vistas necesarias	0,5 días	vie 22-11-24	vie 22-11-24
28		Integración del servicio para obtener los comprobantes	1 día?	vie 22-11-24	lun 25-11-24
29		Implementar herramientas de visualización	1 día	lun 25-11-24	mar 26-11-24
30		Mostrar comprobante y botón de descarga	0,5 días	mar 26-11-24	mar 26-11-24
31		**Fase 7: Desarrollo Page Listar Fondos**	**4 días?**	**mié 27-11-24**	**lun 02-12-24**
32		Listar todos los fondos disponibles	0,5 días	mié 27-11-24	mié 27-11-24
33		Implementar Buscador Fondos	0,5 días	mié 27-11-24	mié 27-11-24
34		Filtros avanzados y autocompletado	1,5 días	mié 27-11-24	jue 28-11-24
35		Consumo de servicios necesarios para la carga	1 día?	vie 29-11-24	vie 29-11-24
36		Filtrar fondos pendientes de rendicion	1 día?	lun 02-12-24	lun 02-12-24
37		**Fase 8: Desarrollo Page Fondos del usuario**	**3 días?**	**mar 03-12-24**	**jue 05-12-24**
38		Cargar los fondos asignados al usuario	1 día?	mar 03-12-24	mar 03-12-24
39		Implementar buscador para los fondos del usuario	1 día?	mié 04-12-24	mié 04-12-24
40		Integración del servicio fondos	1 día	jue 05-12-24	jue 05-12-24
41		**Fase 9: Desarrollo Aprobaciones**	**5 días**	**vie 06-12-24**	**jue 12-12-24**
42		Listar los fondos pendientes de aprobación.	0,5 días	vie 06-12-24	vie 06-12-24
43		Desarrollar sección "Aprobador Jefe"	2 días	vie 06-12-24	mar 10-12-24
44		Desarrollo sección "Aprobador Jefe Administrativo"	1 día	mar 10-12-24	mié 11-12-24
45		Validación de datos, Implementación de servicios	1 día	mié 11-12-24	jue 12-12-24
46		Enviar aprobación	0,5 días	jue 12-12-24	jue 12-12-24
47		**Fase 10: Desarrollo Reembolso**	**4 días?**	**vie 13-12-24**	**mié 18-12-24**
48		Creación de formulario de reembolso	1 día?	vie 13-12-24	vie 13-12-24
49		Validación de datos	0,5 días	lun 16-12-24	lun 16-12-24
50		Integrar el servicio para enviar las solicitudes de reembolso	1 día	lun 16-12-24	mar 17-12-24
51		Bloqueo de reembolso y asignación de fondo. Si el fondo tiene 15 días pendientes de rendición.	1 día?	mar 17-12-24	mié 18-12-24
52		Enviar formulario de reembolso	0,5 días	mié 18-12-24	mié 18-12-24
53		**Fase 11: Desarrollo de proceso de cierre de fondo**	**4,5 días?**	**jue 19-12-24**	**mié 25-12-24**
54		Validar restricciones al cerrar fondo	1 día?	jue 19-12-24	jue 19-12-24
55		Listar fondos disponibles para cierre	0,5 días	vie 20-12-24	vie 20-12-24
56		Implementar neteo de saldos	1 día	vie 20-12-24	lun 23-12-24
57		Implementar opción de exportar en Excel	1 día	lun 23-12-24	mar 24-12-24
58		Marcar fondo como cerrado	1 día?	mar 24-12-24	mié 25-12-24
59		**Fase 12: Integraciónes Notificaciones y Correo**	**5 días?**	**lun 23-12-24**	**vie 27-12-24**
60		Integración de notificaciones y correos	2,5 días?	lun 23-12-24	mié 25-12-24
61		Servicios, metodos, data y notificaciones del flujo	2,5 días?	mié 25-12-24	vie 27-12-24
62		**Fase 13: Testeo Rendiciones 'Fondos'**	**3 días?**	**jue 26-12-24**	**lun 30-12-24**
63		pruebas	3 días	jue 26-12-24	lun 30-12-24
64		**Fase 14: Marcha Blanca Rendiciones 'Fondos'**	**8 días?**	**lun 30-12-24**	**mié 08-01-25**
65		marcha blanca	5 días	lun 30-12-24	vie 03-01-25
66		Actualizacion y lanzamiento de actualizaciones	3 días?	lun 06-01-25	mié 08-01-25
67		~~<Tarea nueva>~~	~~1 día?~~	~~lun 30-12-24~~	~~lun 30-12-24~~
68		***RENDICIONES -v2- VIAJES Y FACTURAS***	***27 días?***	***jue 09-01-25***	***vie 14-02-25***
69		~~<Tarea nueva>~~	~~1 día?~~	~~jue 15-11-24~~	~~jue 15-11-24~~
70		**Fase 15: Integracion Plataforma Viajes a Rendiciones**	**6 días?**	**jue 09-01-25**	**jue 16-01-25**
71		Implementacion de rutas, endpoints, servicios	2 días?	jue 09-01-25	vie 10-01-25
72		Ajustes	2 días?	lun 13-01-25	mar 14-01-25
73		Puebas y validaciones	1 día?	mié 15-01-25	mié 15-01-25
74		Implementacion final y despliegue	1 día?	jue 16-01-25	jue 16-01-25
75		**Fase 16: Marcha blanca y testeo de integración de 'Viajes'**	**3 días?**	**jue 16-01-25**	**lun 20-01-25**
76		Implementación final y despliegue de 'viajes' a rendiciones	3 días?	jue 16-01-25	lun 20-01-25
77		**Fase 17: Modulo ingreso de solicitud.**	**4 días?**	**lun 20-01-25**	**jue 23-01-25**
78		Creación de formulario, validaciones y carga de facturas (PDF)	2 días?	lun 20-01-25	mar 21-01-25
79		Crear y consumir permisos y endpoints	1 día?	mié 22-01-25	mié 22-01-25
80		Consumir API's de usuarios para aprobadores	1 día?	jue 23-01-25	jue 23-01-25
81		**Fase 18: Backend de Facturas**	**3 días?**	**vie 24-01-25**	**mar 28-01-25**
82		Crear y definir modelo de datos y tabla para la solicitud	2 días?	vie 24-01-25	lun 27-01-25
83		Ajuste de urls, views, y endpoints	1 día?	mar 28-01-25	mar 28-01-25
84		**Fase 19: Modulo Aprobaciones**	**4 días?**	**mar 28-01-25**	**vie 31-01-25**
85		Crear modulo de aprobadores	2 días?	mar 28-01-25	mié 29-01-25
86		Filtrar vistas por aprobadores y configurar los endpoints por aprobador.	1 día	jue 30-01-25	jue 30-01-25
87		Ingreso y guardado de data	1 día	jue 30-01-25	jue 30-01-25
88		Modal para mostrar la factura (PDF)	1 día?	vie 31-01-25	vie 31-01-25
89		**Fase 20: Modulo de Gestión de pago de facturas**	**3 días?**	**lun 03-02-25**	**mié 05-02-25**
90		Configuración de endpoint, y servicios	1 día?	lun 03-02-25	lun 03-02-25
91		Cargar de data	1 día?	mar 04-02-25	mar 04-02-25
92		Formulario, ingreso de pago y calculo	1 día?	mié 05-02-25	mié 05-02-25
93		**Fase 22: Integración notificaciones y correos 'Viajes' y 'Facturas'**	**5 días?**	**lun 03-02-25**	**vie 07-02-25**
94		Implementacion de servicios de notificaciones y correos	2,5 días?	lun 03-02-25	mié 05-02-25
95		Servicios, metodos, data, flujo de notificaciones	2,5 días?	mié 05-02-25	vie 07-02-25
96		**Fase 21: Modulo listado detallado de solicitudes**	**3 días?**	**jue 06-02-25**	**lun 10-02-25**
97		Implementacion de servicios, vistas	1 día?	jue 06-02-25	jue 06-02-25
98		Cargar de solicitudes y data.	1 día?	vie 07-02-25	vie 07-02-25
99		Editar y eliminar	1 día?	lun 10-02-25	lun 10-02-25
100		**Fase 23: Marcha Blanca y Testeo 'Facturas'**	**4,5 días?**	**lun 10-02-25**	**vie 14-02-25**
101		Marcha blanca implementacino 'Facturas'	1,5 días	lun 10-02-25	mar 11-02-25
102		Teste implementación 'Facturas'	3 días	mié 12-02-25	vie 14-02-25

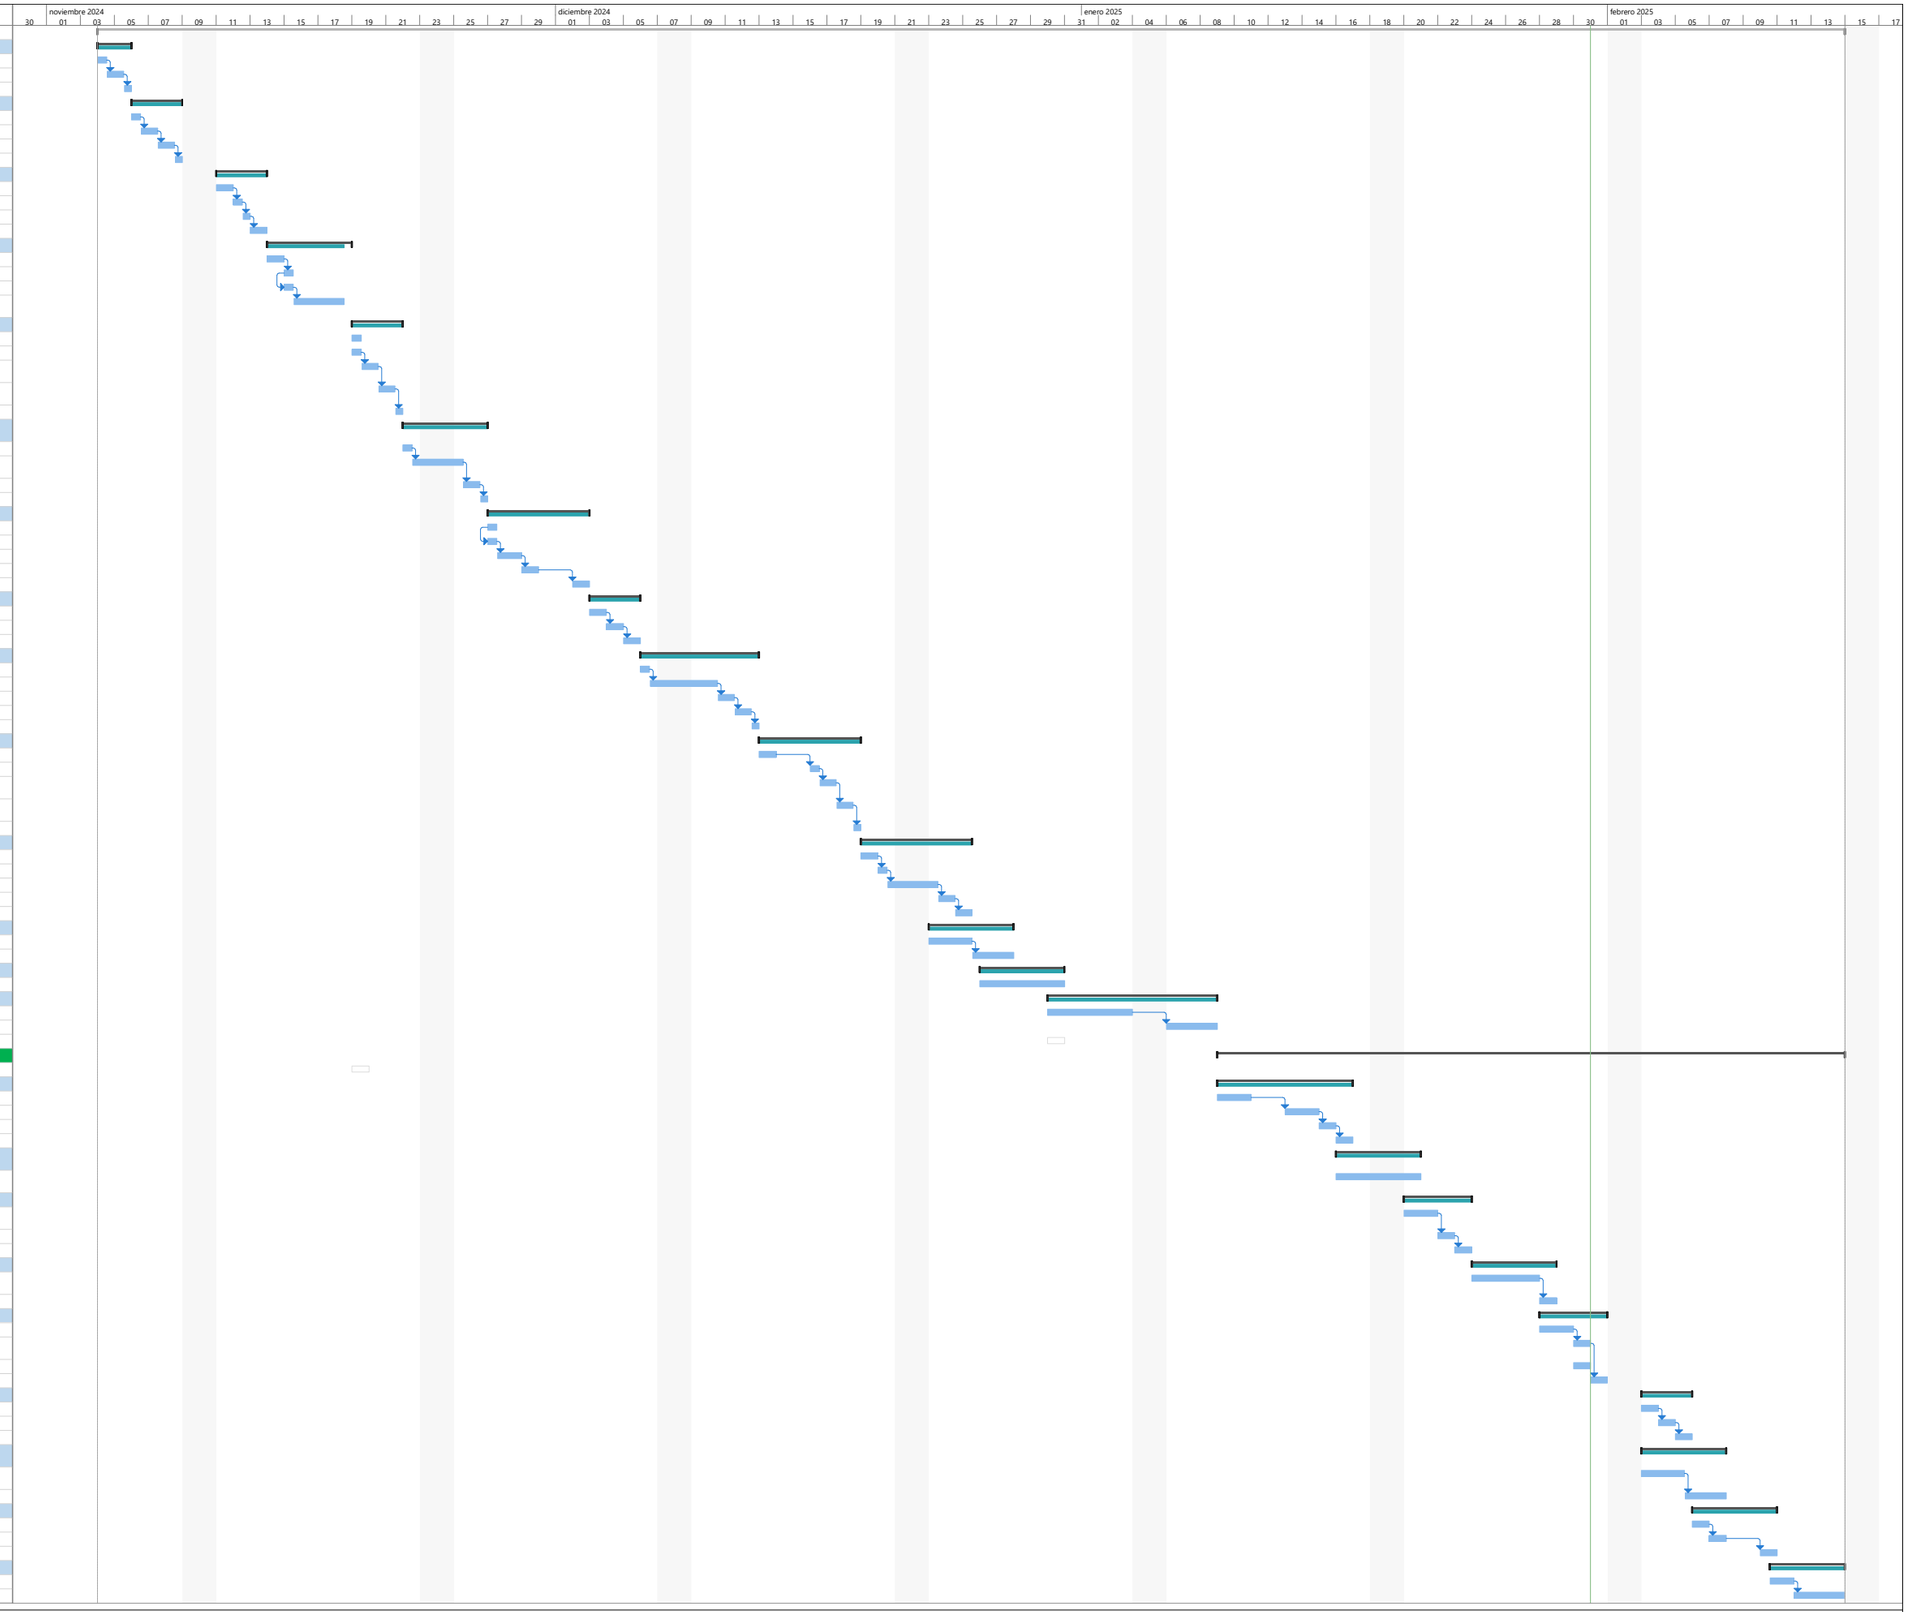

Proyecto: Rendiciones
Fecha: vie 31-01-25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

17 19 21 23 25 27 marzo 2025 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 abril 2025 31 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 mayo 2025 30 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 junio 2025 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 julio 2025 01 03 05 07

Proyecto: Rendiciones
Fecha: vie 31-01-25

Tarea		Hito		Resumen del proyecto		Hito inactivo		Tarea manual		Informe de resumen manual		solo el comienzo		Tareas externas		Fecha límite		Progreso manual	
División		Resumen		Tarea inactiva		Resumen inactivo		solo duración		Resumen manual		solo fin		Hito externo		Progreso			
